


# Planificación de Cosecha

Compañía Forestal Uruguaya S.A.

20



## 1. Identificación del área a intervenir

Departamento: RIVERA      Puesto : Pedrozo Pintos      Nro Plan: 874  
Potrero : Pedrozo Pintos Potrero 1      Parcelas : 0001-0015

## 2. Información de inventario

Superficie	Especie	Estrato	Volumen proyectado a cosechar (m3 totales)				Total
			Aserrable	Postes	Pulpa	Columnas	
70	E.grandis	1996	20900	0	10500	0	31400

34  
60  
40  
5  
44851  
449

## 3. Información silvícola

Tipo de Intervención : Tala Rasa      Criterio Marcación : No corresponde  
Acción Rebrote : Aprovechar      Densidad Inicial : 120      Densidad Final : 0  
Tolerancia Arboles Dañados: 0 %      Descuento por Arbol: 250

## 4. Información de cosecha

### 4.1. Esquema de trabajo

Empresa Contratista : Dalfoy S.A.

Productos a Elaborar		Aserrable	Rolos Expo	Pulpa	Columnas	Col - Pulpa
		Si	No	Si	No	No
Actividades	1) Apeo	Feller		Feller		
Actividades	2) Desrame	Motosierr		Harvester		
Actividades	3) Medición	Harvester		Harvester		
Actividades	4) Trozado	Harvester		Harvester		
Actividades	5) Descortezado	Harvester		Harvester		
Actividades	6) Engavillado	Harvester		Harvester		
Actividades	7) Enchapado	No aplica		No aplica		
Actividades	8) Extracción	Forwarder		Forwarder		
Actividades	9) Carga	Forwarder		Grapo		

Comentarios: Se utiliza calibre en base, se despunta hasta dejar diametro maximo aserradero.

### 4.2. Ritmo de Produccion

### 4.3. Infraestructura requerida

Fecha estimada de inicio : 19/10/2018

Camineria : Bacheo caminos principal

Fecha estimada de finalizacion : 28/11/2018

Salida:

Alambrados : Se saca contra camino vecinal. Se vuelve a colocar cuando se termine

Otros : S/C

### 4.4. Areas de especial

Cursos de agua y zonas bajas

Responsable Inventario \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Responsable Cosecha \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Alfalo con los guanos  
culo...

## Orden de Producción

Monte: Pedrozo Pintos Potrero: 038001  
Fecha de Inicio: 19/10/2018 Tipo de intervención: Tala Rasa  
Contratista: Dalfev S.A.

### Productos Aserrables

#### Podados

Cantidad trozas/árbol: Primera

---

Largo de trozas en metros: 5.10

---

Maximo 5.17

---

Minimo 5.03

---

Diámetro máximo absoluto (cm): 75

---

Diámetro mínimo absoluto (cm): 30

---

Observaciones de la producción

#### No Podados

Cantidad trozas/árbol: Segunda y tercera

---

Largo de trozas en metros: 5.10

---

Maximo 5.17

---

Minimo 5.03

---

Diámetro máximo absoluto (cm): 75.0

---

Diámetro mínimo absoluto (cm): 33.0

---

Observaciones de la producción

#### Pulpa

Largo: 7.20 Minimo: 2.40

---


Diámetro Máximo: 55.00 Diámetro Mínimo: 5.00

---

Observaciones

Emitido Por:

# Pedrozo Pintos

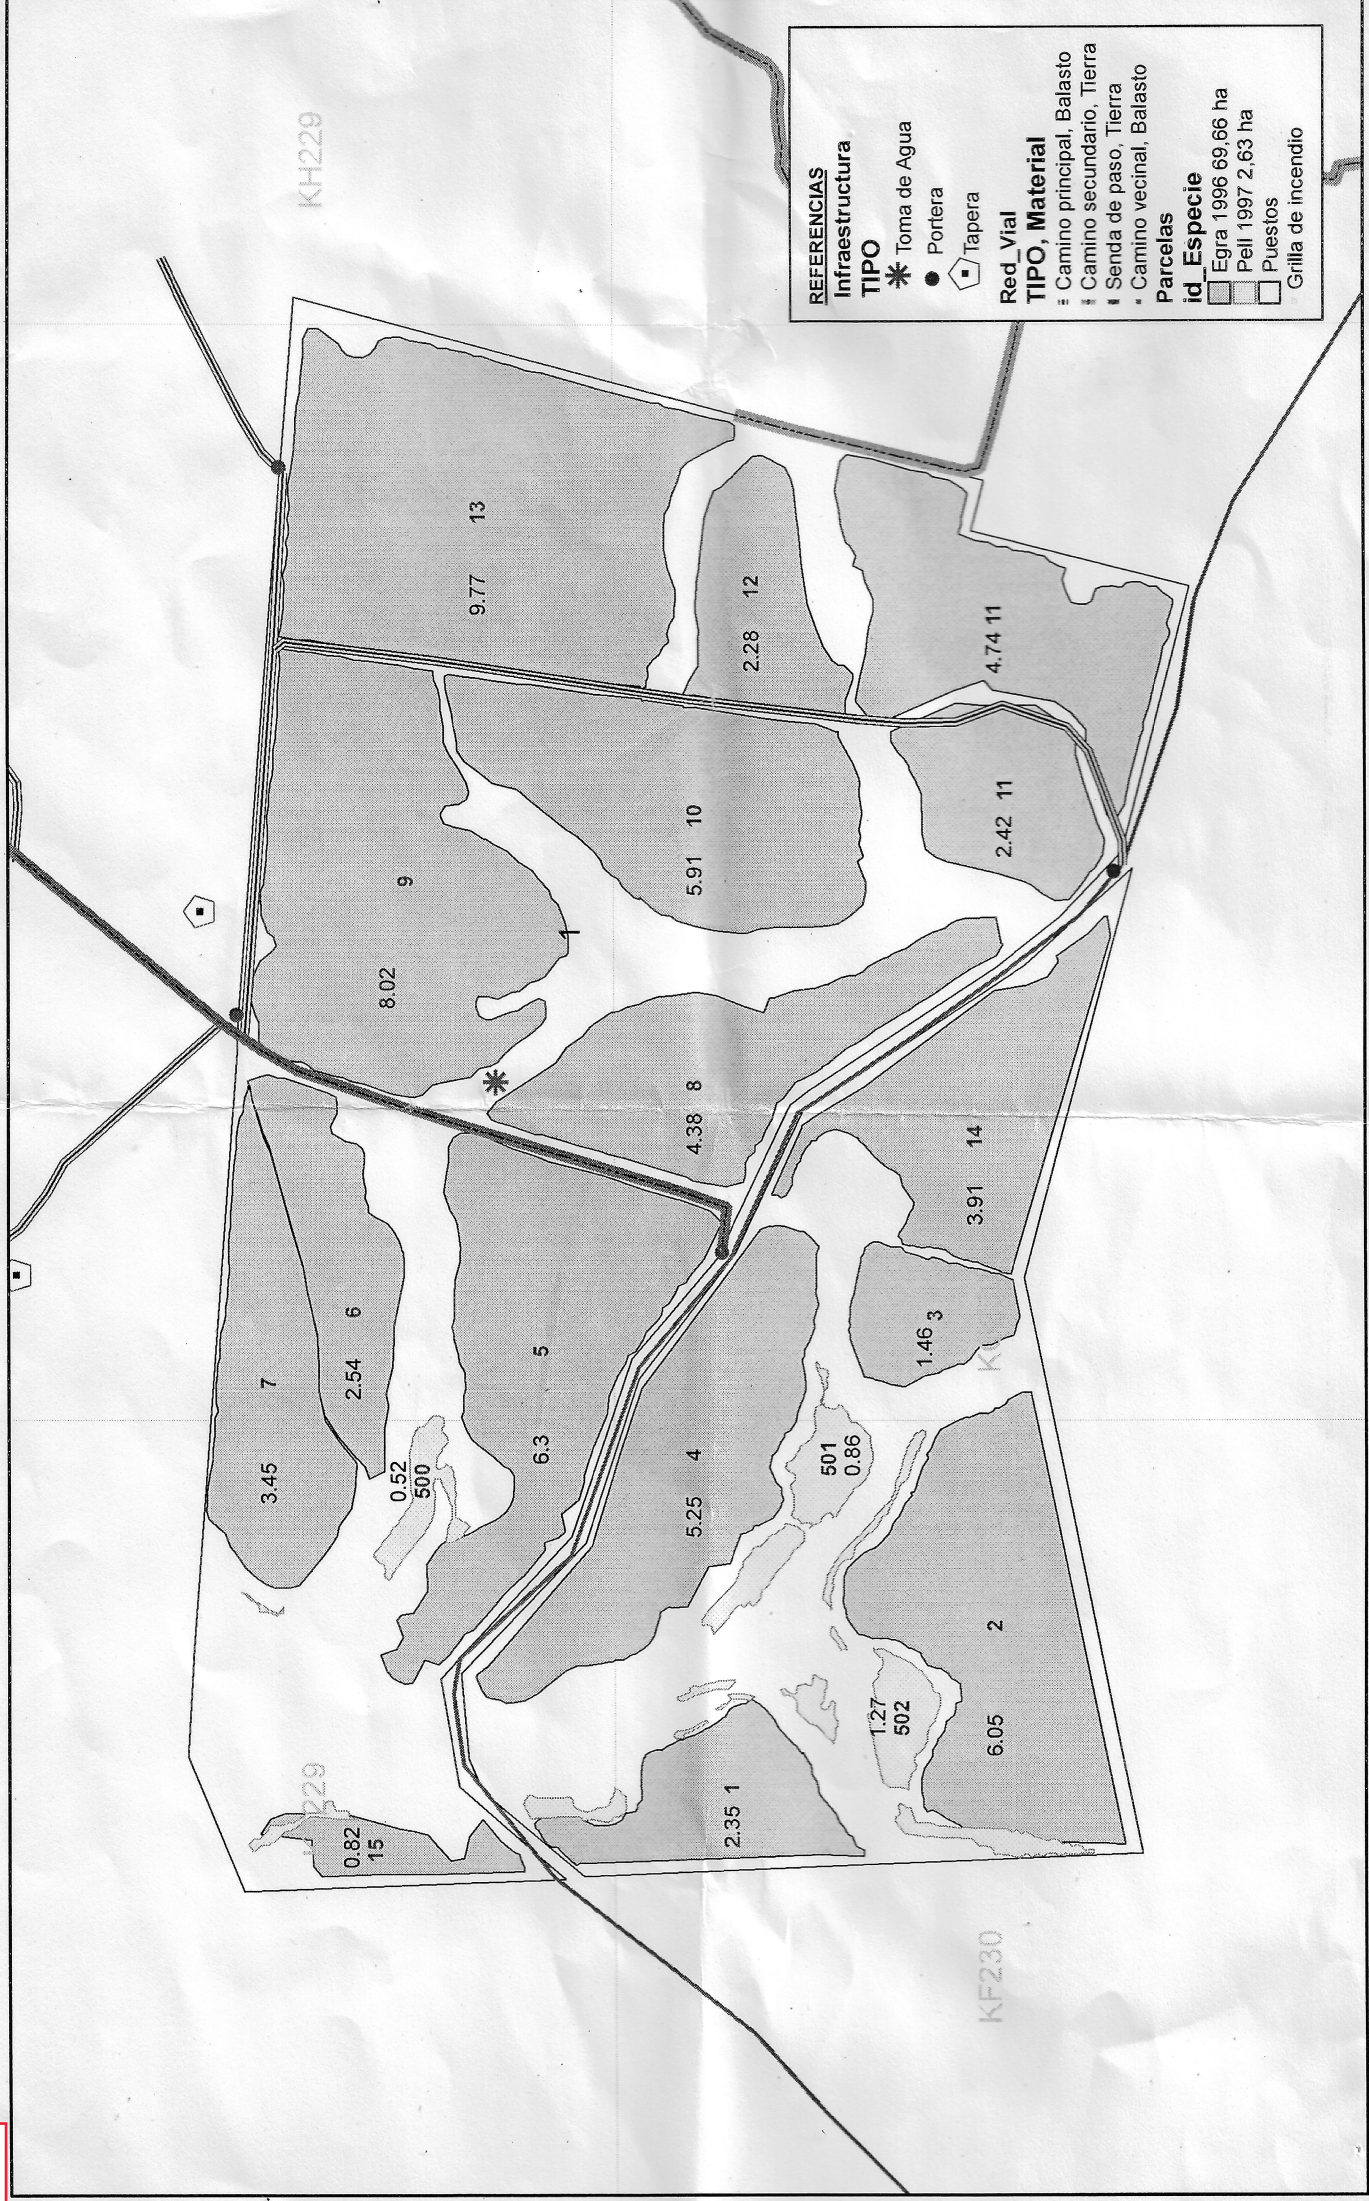

**REFERENCIAS**  
Infraestructura

**TIPO**  
\* Toma de Agua  
● Portera  
□ Tapera

**Red\_Vial**  
TPO, Material

- ▬ Camino principal, Balasto
- ▬ Camino secundario, Tierra
- ▬ Senda de paso, Tierra
- ▬ Camino vecinal, Balasto

**Parcelas**

**id\_Especie**

- Egra 1996 69,66 ha
- Pell 1997 2,63 ha
- Puestos
- Grilla de incendio

Fecha mapa: 11/10/2018

800 Metros

400

200

0

1:7,000

### **MONITOREO Y EVOLUCION DEL AREA COSECHADA**

**Nro Plan: 874**

**Potrero: Pedrozo Pintos Potrero 1**

<b>Parcela</b>	<b>Area</b>	<b>Fecha Cierre</b>	<b>Arboles Dañados</b>	<b>Observaciones</b>
0001	2.35			
0002	5.86			
0003	1.46			
0004	5.30			
0005	6.41			
0006	2.54			
0007	3.45			
0008	4.36			
0009	8.02			
0010	5.91			
0011	7.19			
0012	2.28			
0013	9.77			
0014	4.04			
0015	0.96			
